



Erneuerung der Wasserversorgung entlang der Landesstrasse L324 und Breitbandausbau



Schlier
„NOTVERBUND“


Neuwaldburg

Vogt

HAUPTSEITE

WASSER WALDBURG - L324

LEERROHRE WALDBURG - L324

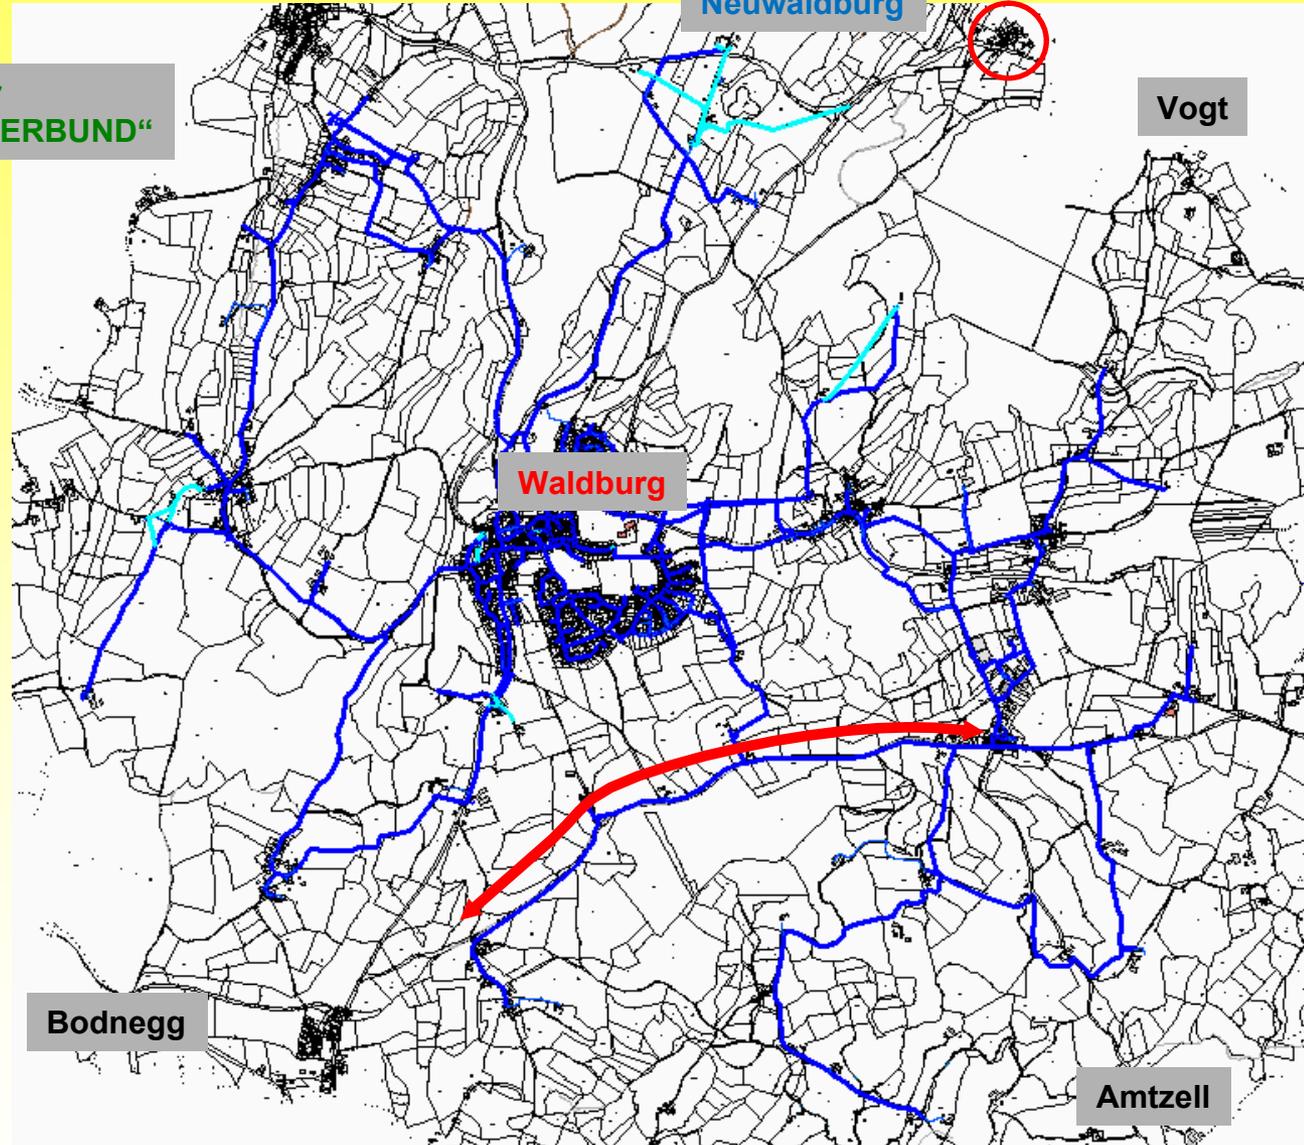

Waldburg

Bodnegg


Amtzell





HAUPTSEITE

Übersichtsplan

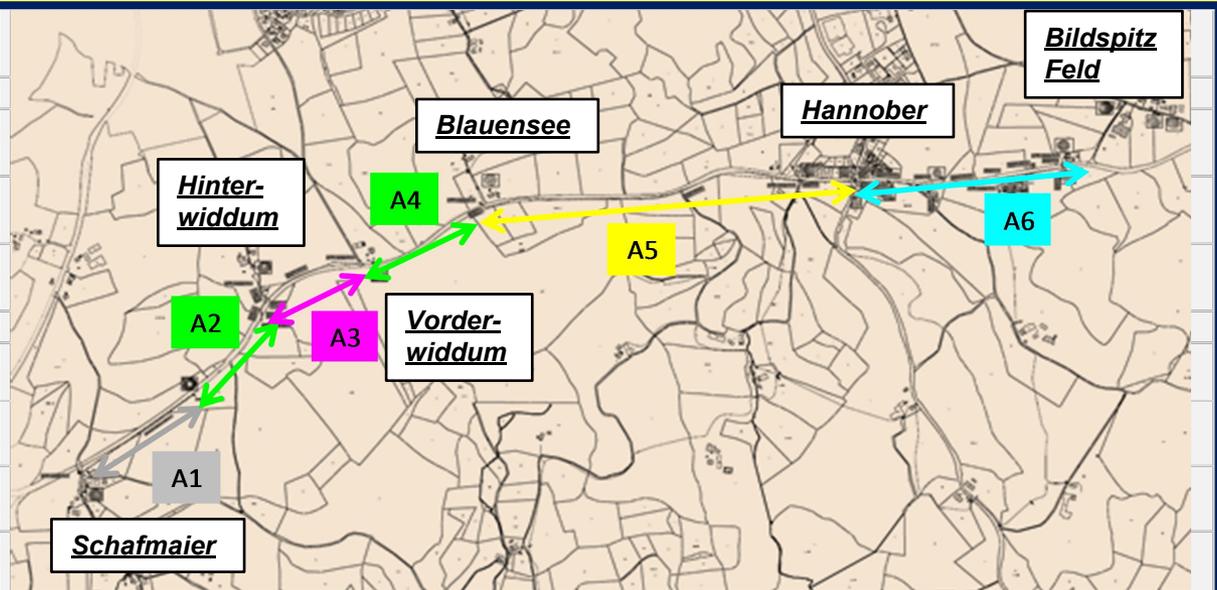

Kostenübersicht

Vergabeinformation

2018 ->

2018 ->

erledigt ->

	Zeitschiene geplant				
↔	2017	Abschnitt 1	Länge ca. 440 m	Schafmaier nach Umschluss (Bestand)	
↔	2014	Abschnitt 2	Länge ca. 305 m	Umschluss (Bestand) nach Hinterwiddum	
↔	2019 (?)	Abschnitt 3	Länge ca. 430 m	Hinterwiddum nach Vorderwiddum	
↔	2014	Abschnitt 4	Länge ca. 440 m	Vorderwiddum nach Blauensee	
↔	2017	Abschnitt 5	Länge ca. 1150 m	Blauensee nach Hannover (Mitbau mit RGW)	
↔	ca. 2025	Abschnitt 6	Länge ca. 660 m	Hannover nach Feld	
		Gesamt	Länge ca. 3425 m		



WV entlang L324 - L324 / WV Kostenübersicht

KOSTENÜBERSICHT								
Maßnahme:		Maßnahme - Titel	Erneuerung WV entlang der L324					
BRUTTOKOSTEN		Maßnahme - Nummer	ZM-16-A240					
Bruttokosten	ART	FIRMA			Wasserversorgung			Wasserversorgung
Kostenschätzung KS	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		75.648,30 €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	97.234,90 €
	BAU		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau		101.988,95 €			- €
	BAU				- €			- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		10.142,43 €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	14.077,84 €
	HONORAR		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau		14.293,88 €			- €
			SUMME KS			202.073,56 €		
Kostenberechnung KB	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		97.538,35 €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	76.208,17 €
	BAU		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau		90.708,94 €			- €
	BAU				- €			- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		10.142,43 €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	14.077,84 €
	HONORAR		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau		14.293,88 €			- €
			SUMME KV			212.683,60 €		
Vergabe VG	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	Fa.Dobler	104.469,64 €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	95.313,14 €
	BAU		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau	Fa.Lohr	63.301,68 €			- €
	BAU		ERWEITERUNG HANNOBER		30.000,00 €			- €
	HONORAR		ERWEITERUNG HANNOBER		4.000,00 €			- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	Z&M	10.142,43 €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	14.077,84 €
	HONORAR		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau	Z&M	14.293,88 €			- €
			SUMME VG			226.207,63 €		
Abrechnung AR	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		- €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	- €
	BAU		Abschnitt 5 - Rohrleitungsbau	Lohr	43.794,59 €			- €
	BAU		Abschnitt 5 - Zusatz HA - Kirche - Rohrleitungsbau	Lohr	819,95 €			- €
	BAU		Abschnitt 5 - Zusatz Streckenschieber - Rohrleitungsbau	Lohr	1.075,52 €			- €
	BAU		Abschnitt 5 - OD Hannover - Rohrleitungsbau		- €			- €
	BAU		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau		- €			- €
	BAU				- €			- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		- €		Abschnitt 1+3 - Tiefbau	- €
	HONORAR		Abschnitt 1+3+5 - Rohrleitungsbau		- €			- €
			SUMME AR			45.690,06 €		
Differenz VG - KS	in €				24.134,07 €			-1.921,76 €
	in %				11,94%			-1,73%
Differenz AR - KS	in €				-156.383,50 €			-111.312,74 €
	in %				-77,39%			-100,00%
Differenz AR - VG	in €				-180.517,57 €			-109.390,98 €
	in %				-79,80%			-100,00%



WV entlang L324 - L324 / WV Vergabeinformation

KOSTENÜBERSICHT

Maßnahme: Massnahme - Titel **Breitband Ravensburg 2017-2**
 Massnahme - Nummer **ZM-17-A128**

NETTOSUMMEN


Gemeinde Waldburg

Bruttokosten	ART	FIRMA		Los 3 - Waldburg	Waldburg-Erd WV	Gesamt
Kostenschätzung KS	BAU	17.10.2017	Bodnegg	79.390,00 €	81.710,00 €	161.100,00 €
	BAU		Waldburg	36.500,00 €	- €	36.500,00 €
	HONORAR		ca.	11.000,00 €	11.830,12 €	22.830,12 €
		SUMME KS		126.890,00 €	93.540,12 €	220.430,12 €
Kostenberechnung KB	BAU	22.11.2017	Bodnegg	148.405,03 €	63.326,82 €	211.731,85 €
	BAU	22.11.2017	Waldburg	63.602,15 €	- €	63.602,15 €
	HONORAR		ca.	21.000,00 €	10.000,00 €	31.000,00 €
		SUMME KV		233.007,18 €	73.326,82 €	306.334,00 €
Vergabe VG	BAU	25.01.2018	Bodnegg	137.266,38 €	80.095,08 €	217.361,46 €
	BAU	25.01.2018	Waldburg	58.828,46 €	- €	58.828,46 €
	HONORAR		ca.	18.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €
		SUMME VG		214.094,84 €	90.095,08 €	304.189,92 €
Abrechnung AR	BAU			- €	- €	- €
	BAU			- €	- €	- €
	BAU			- €	- €	- €
	BAU			- €	- €	- €
	HONORAR			- €	- €	- €
		SUMME AR		- €	- €	- €
Differenz VG - KB	in €			18.922,34 €	16.768,26 €	-2.144,08 €
	in %			8,12%	22,87%	-0,70%
Differenz AR - KB	in €			-233.007,18 €	-73.326,82 €	-306.334,00 €
	in %			-100,00%	-100,00%	-100,00%
Differenz AR - VG	in €			-214.094,84 €	-90.095,08 €	-304.189,92 €
	in %			-100,00%	-100,00%	-100,00%

ohne Gewähr
 Wertung noch
 nicht abgeschlossen




WV entlang L324 - L324 / WV Gemeinde ÜBERSICHT

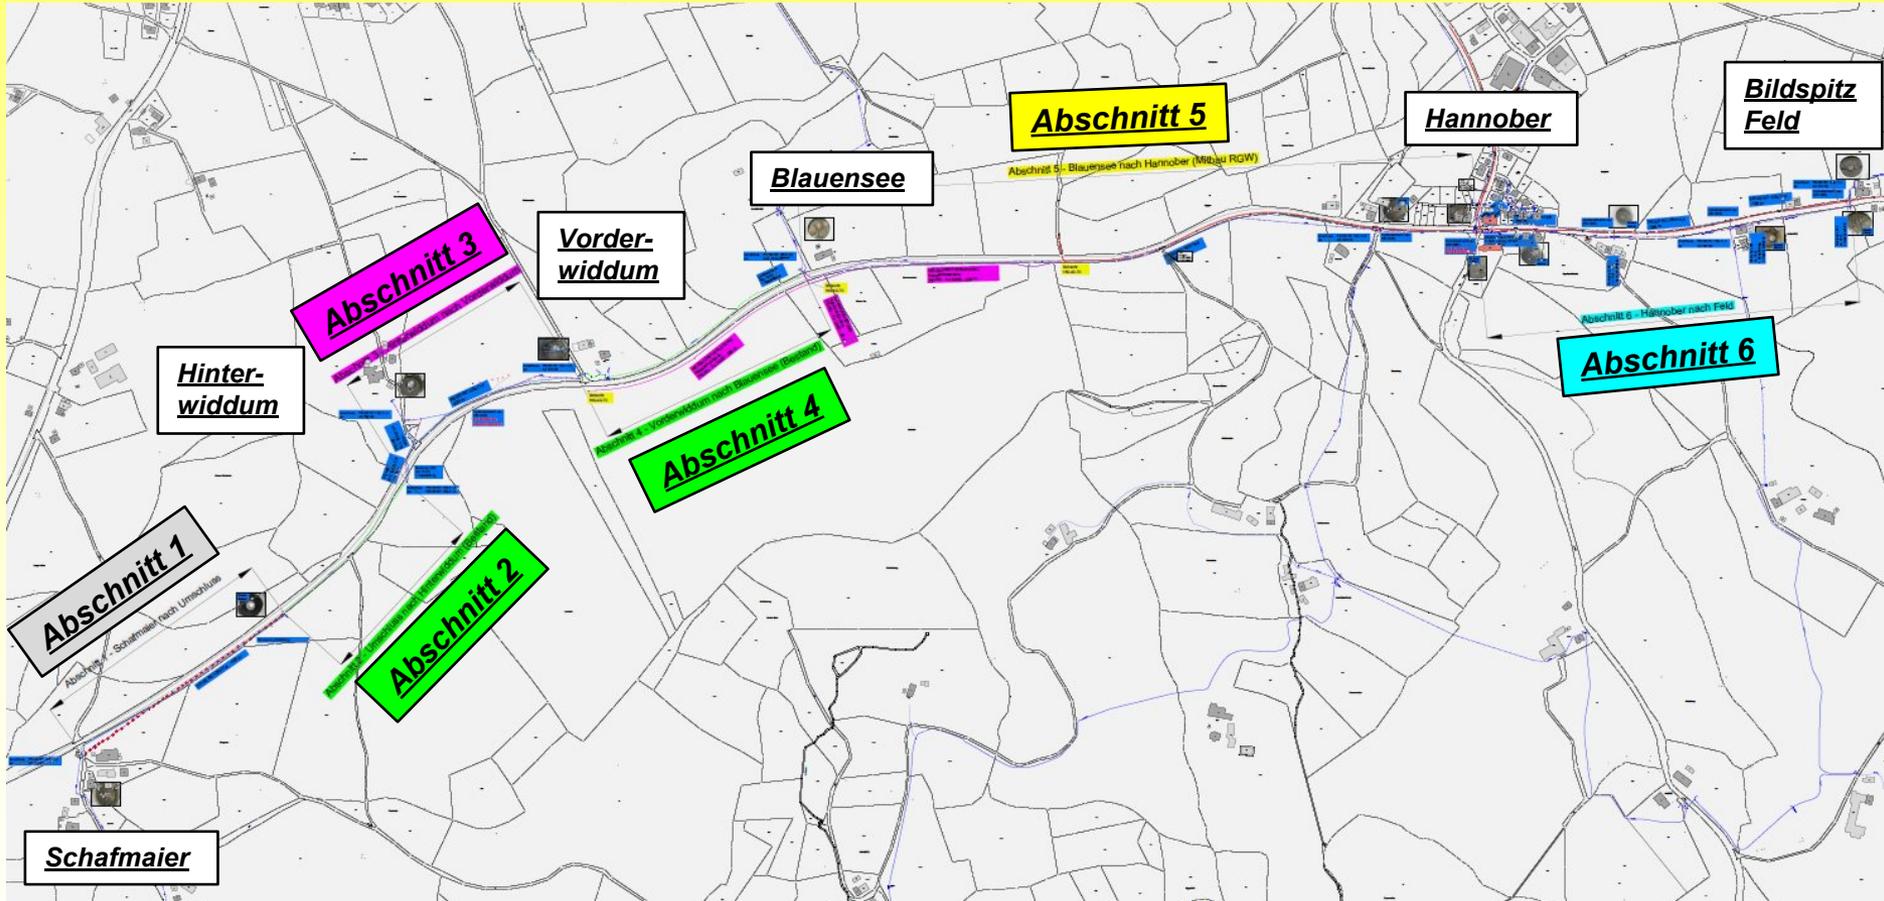



WV entlang L324 - L324 / WV Gemeinde PLAN A5

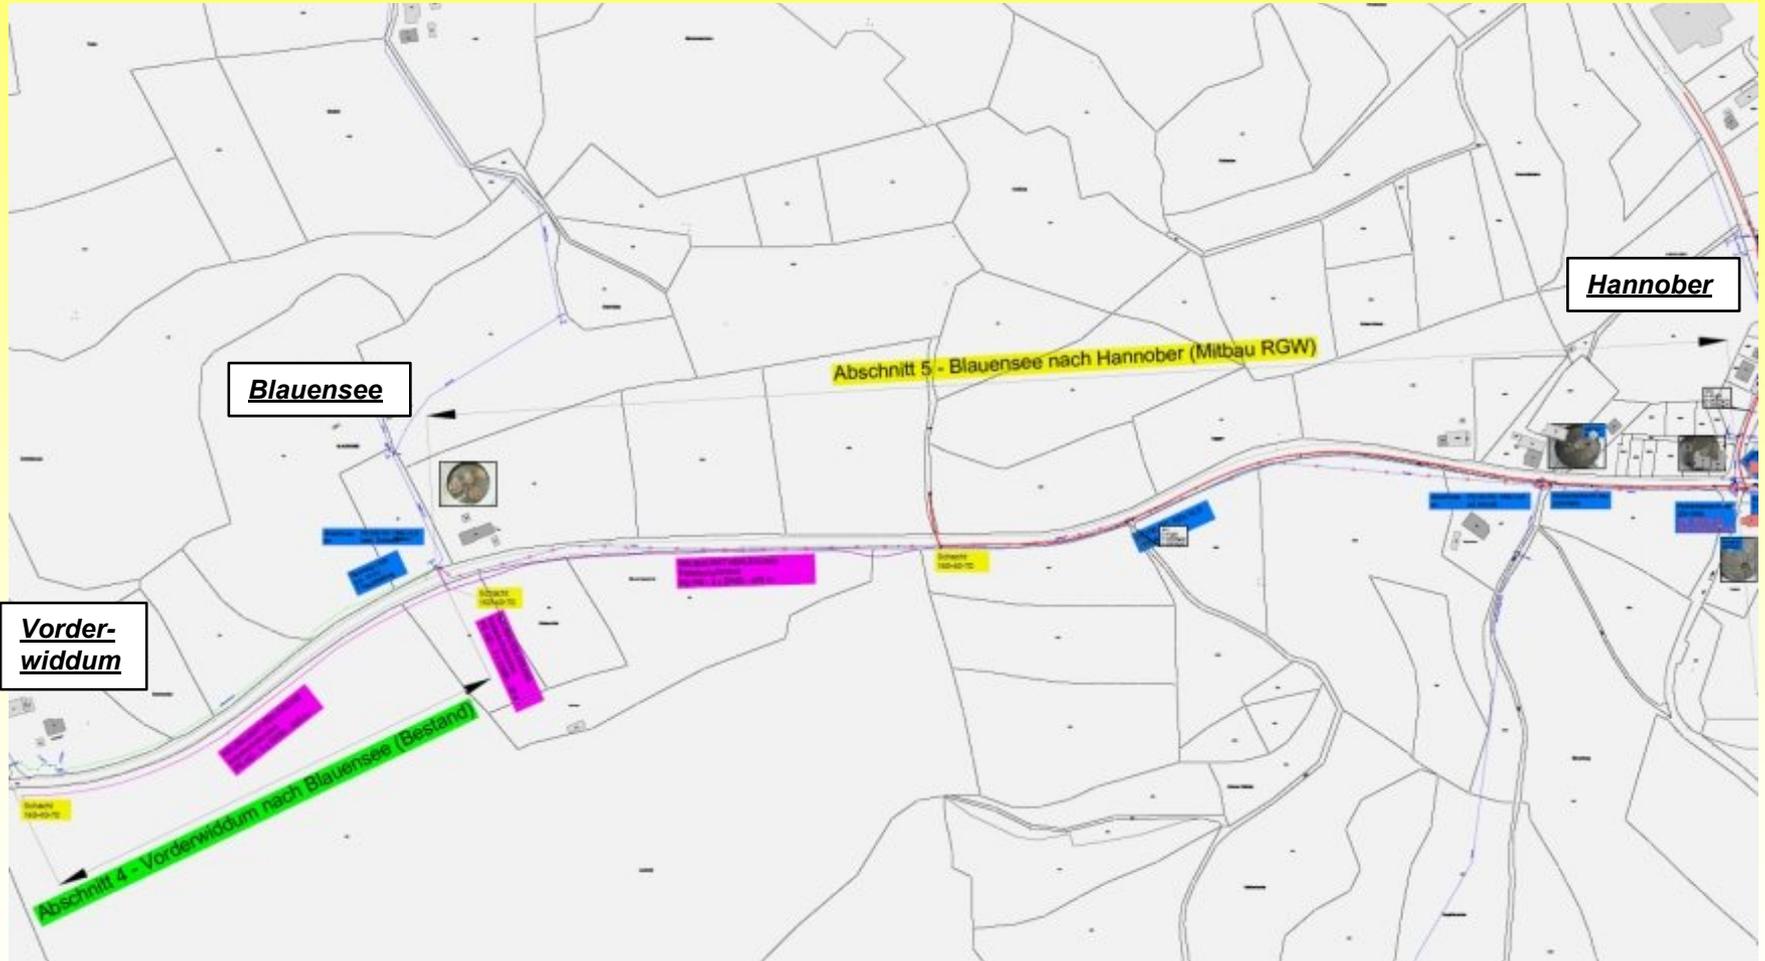




HAUPTSEITE

Kostenübersicht

Vergabeinformation

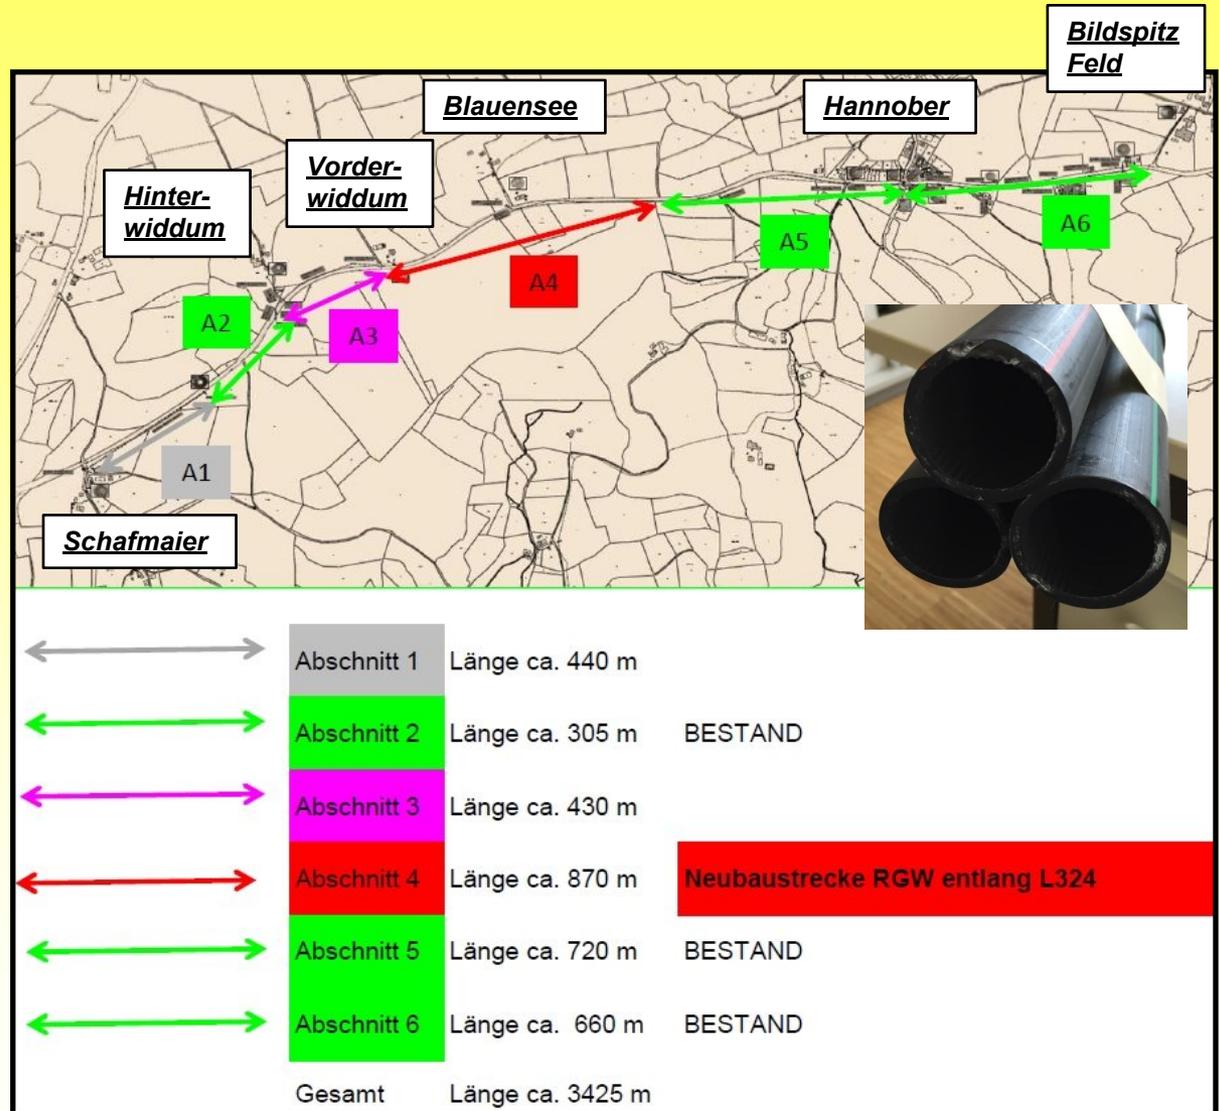



WV entlang L324 - Leerrohre Kostenübersicht

KOSTENÜBERSICHT									
Maßnahme:		Massnahme - Titel		Erneuerung WV entlang der L324					
BRUTTOKOSTEN		Massnahme - Nummer		ZM-16-A240					
						NUR ANTEIL WALDBURG			
Bruttokosten	ART	FIRMA			Breitband			Breitband	Gesamt
Kostenschätzung KS	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	100%	44.999,37 €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	22.837,94 €	67.838,31 €
	BAU	Nachtrag	MIKROVERROHRUNG	Fa.Dobler	35.000,00 €		MIKROVERROHRUNG	12.000,00 €	47.000,00 €
	BAU				- €			- €	- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	100%	5.807,94 €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	4.474,75 €	10.283,69 €
	HONORAR		MIKROVERROHRUNG		4.000,00 €		MIKROVERROHRUNG	1.200,00 €	5.200,00 €
		SUMME KS			89.807,31 €			40.512,69 €	130.320,00 €
Kostenberechnung KB	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	100%	43.690,39 €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	77.946,18 €	121.637,57 €
	BAU	Nachtrag	MIKROVERROHRUNG	Fa.Dobler	35.000,00 €			- €	35.000,00 €
	BAU				- €			- €	- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	100%	5.807,94 €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	10.282,69 €	16.091,63 €
	HONORAR		MIKROVERROHRUNG		4.000,00 €		MIKROVERROHRUNG	1.200,00 €	5.200,00 €
		SUMME KV			88.498,33 €			89.428,87 €	177.927,20 €
Vergabe VG	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	Fa.Dobler	47.719,62 €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	70.005,86 €	117.725,48 €
	BAU	Nachtrag	MIKROVERROHRUNG	Fa.Dobler	35.000,00 €			- €	35.000,00 €
	BAU				- €			- €	- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	Z&M	5.807,94 €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	Z&M 4.205,75 €	10.013,69 €
	HONORAR		MIKROVERROHRUNG		4.000,00 €		MIKROVERROHRUNG	1.200,00 €	5.200,00 €
		SUMME VG			92.527,56 €			75.411,61 €	167.939,17 €
Abrechnung AR	BAU		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau	Fa. Dobler	- €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	- €	- €
	BAU				- €			- €	- €
ABRECHNUNG STEHT NOCH AUS	BAU				- €			- €	- €
	HONORAR		Abschnitt 5 (RGW) - Tiefbau		- €		Abschnitt 0+3 - Tiefbau	Z&M - €	- €
	HONORAR				- €			- €	- €
		SUMME AR			- €			- €	- €
Differenz VG - KS	in €				2.720,25 €			34.898,92 €	-9.988,03 €
	in %				3,03%			86,14%	-7,66%
Differenz AR - KS	in €				-89.807,31 €			-40.512,69 €	-130.320,00 €
	in %				-100,00%			-100,00%	-100,00%
Differenz AR - VG	in €				-92.527,56 €			-75.411,61 €	-167.939,17 €
	in %				-100,00%			-100,00%	-100,00%



WV entlang L324 - Leerrohre Vergabeinformation

KOSTENÜBERSICHT

Maßnahme: Massnahme - Titel **Breitband Ravensburg 2017-2**
 Massnahme - Nummer **ZM-17-A128**

NETTOSUMMEN

Gemeinde Waldburg

Bruttokosten	ART	FIRMA		Los 3 - Waldburg	Waldburg-Erd WV		Gesamt
Kostenschätzung KS	BAU	17.10.2017	Bodnegg	79.390,00 €	81.710,00 €		161.100,00 €
	BAU		Waldburg	36.500,00 €	- €		36.500,00 €
	HONORAR		ca.	11.000,00 €	11.830,12 €		22.830,12 €
		SUMME KS		126.890,00 €	93.540,12 €		220.430,12 €
Kostenberechnung KB	BAU	22.11.2017	Bodnegg	148.405,03 €	63.326,82 €		211.731,85 €
	BAU	22.11.2017	Waldburg	63.602,15 €	- €		63.602,15 €
	HONORAR		ca.	21.000,00 €	10.000,00 €		31.000,00 €
		SUMME KV		233.007,18 €	73.326,82 €		306.334,00 €
Vergabe VG	BAU	25.01.2018	Bodnegg	137.266,38 €	80.095,08 €		217.361,46 €
	BAU	25.01.2018	Waldburg	58.828,46 €	- €		58.828,46 €
	HONORAR		ca.	18.000,00 €	10.000,00 €		28.000,00 €
		SUMME VG		214.094,84 €	90.095,08 €		304.189,92 €
Abrechnung AR	BAU			- €	- €		- €
	BAU			- €	- €		- €
	BAU			- €	- €		- €
	BAU			- €	- €		- €
	HONORAR			- €	- €		- €
		SUMME AR		- €	- €		- €
Differenz VG - KB	in €			18.922,34 €	16.768,26 €		-2.144,08 €
	in %			8,12%	22,87%		-0,70%
Differenz AR - KB	in €			-233.007,18 €	-73.326,82 €		-306.334,00 €
	in %			-100,00%	-100,00%		-100,00%
Differenz AR - VG	in €			-214.094,84 €	-90.095,08 €		-304.189,92 €
	in %			-100,00%	-100,00%		-100,00%

ohne Gewähr
 Wertung noch
 nicht abgeschlossen



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

